

Commune de Menthon-Saint-Bernard – Travaux d'alimentation en eau potable, d'enfouissement de réseaux secs (électrique et télécom) et d'aménagement de voirie

Travaux coordonnés associant 3 maîtres d'ouvrage :

- Le Grand Annecy pour le renouvellement du réseau d'eau potable
- Le SYANE pour l'enfouissement des réseaux « secs » (réseau électrique, éclairage public et réseau télécom)
- La commune de Menthon-Saint-Bernard pour les travaux d'aménagement de voirie (y-compris réseau eaux pluviales de voirie)

Entreprises chargées de la réalisation des travaux :

Groupe TPLM / FERRAND – lot 1 – travaux de « génie civil » réseaux eau potable et enfouissement réseaux secs

Conducteur d'opération : Guillaume Delaunay - Mail : contact@tplm73.com – l'interlocuteur sur place sera le chef de chantier

EUROVIA – lot 2 – aménagement de voirie et réfection d'enrobés


CECCON – lot 3 – éclairage public et câblage

Maîtrise d'œuvre :

Eau potable : Direction de l'eau potable du Grand Annecy – Technicien d'opération : Jordan Veyssière – jveyssiere@grandannecy.fr

Réseaux secs et aménagement de voirie : Bureau d'étude Géoprocess - Sambaz Oz - sambaz.oz@geoprocessalpes.fr

Zones de travaux

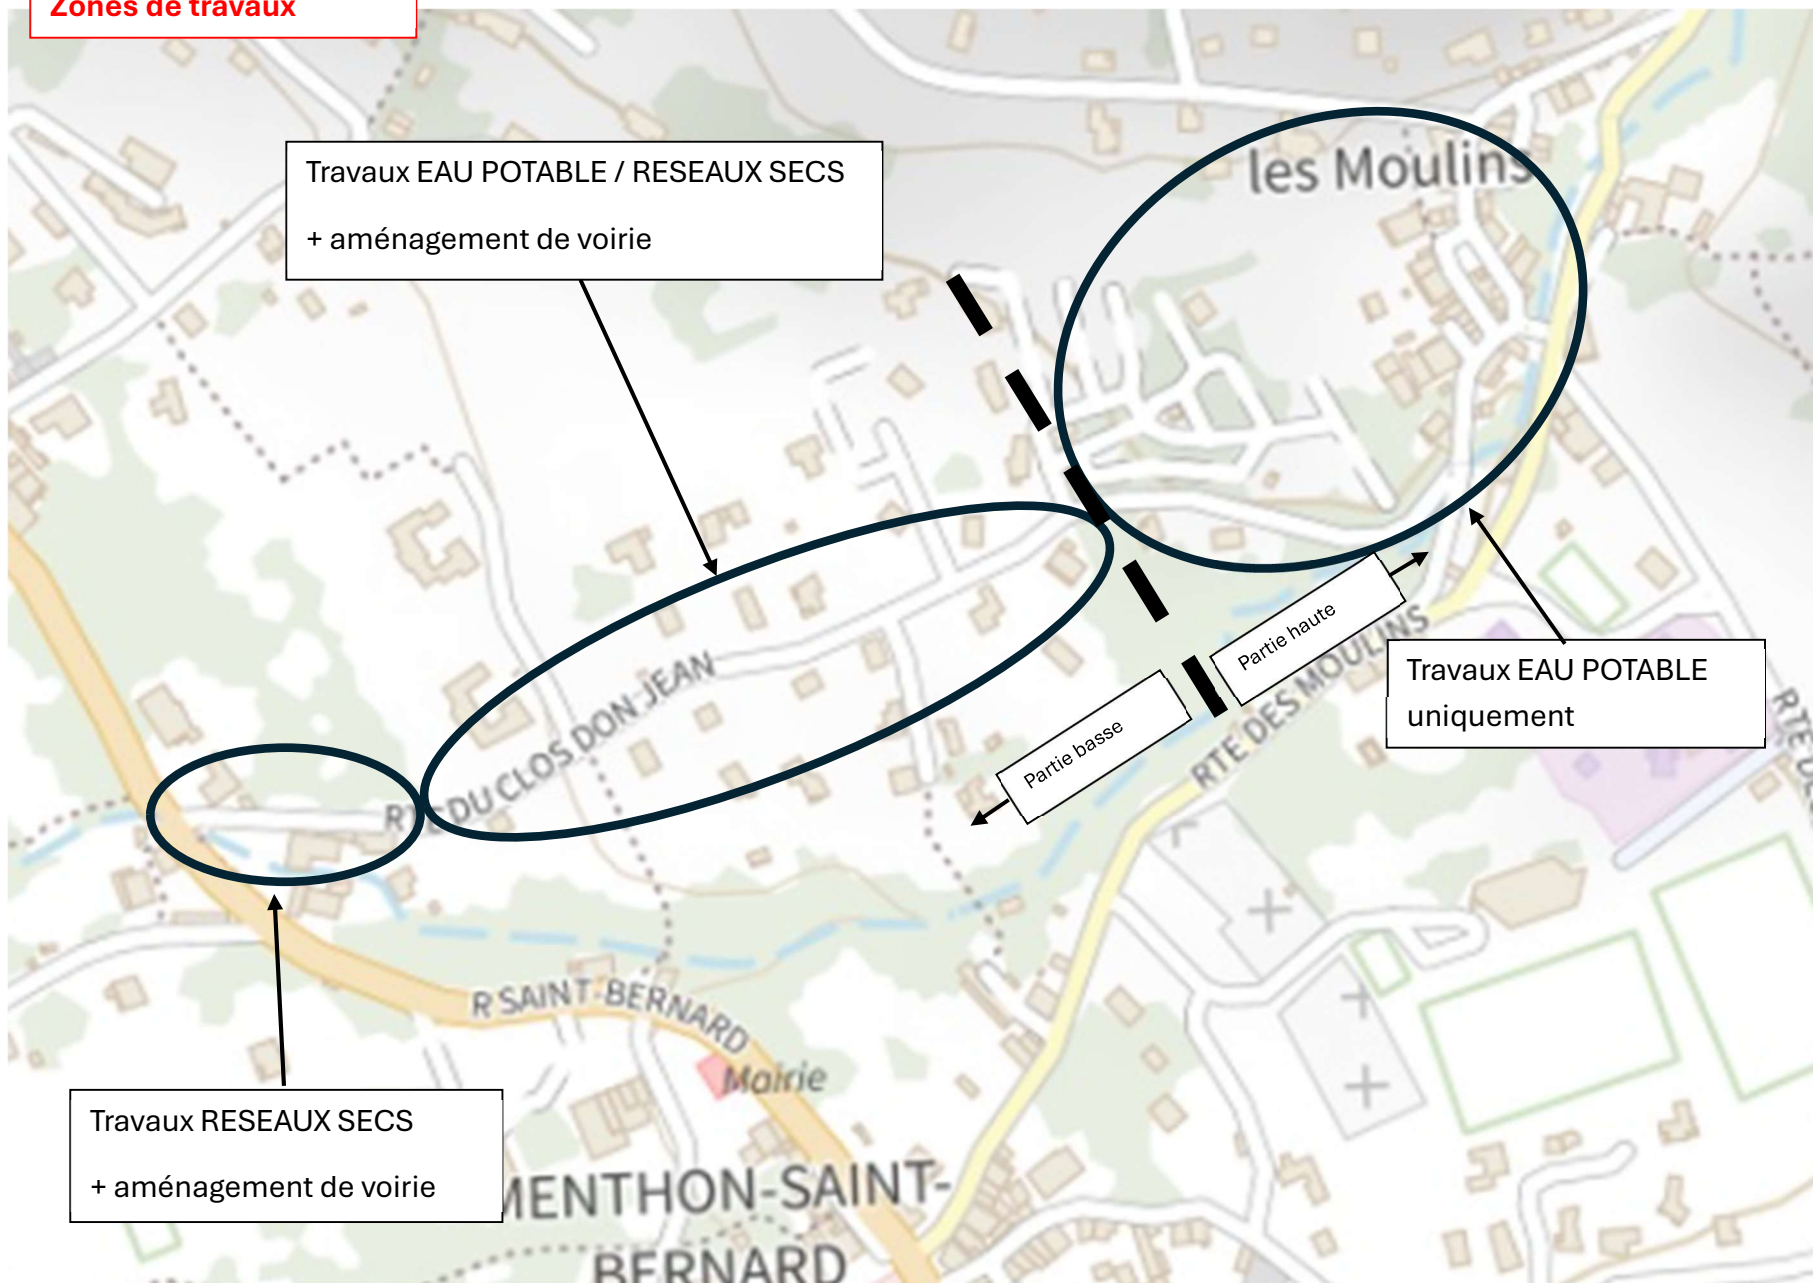

Planning prévisionnel

Le phasage des travaux du lot 1 et les impacts sur la circulation sont décrits à partir de la page 5.


Le planning global pour l'ensemble du chantier (partie basse et haute) est de 6 mois ; soit de septembre 2026 à février 2027

Pour la partie « basse », la fin des travaux est prévue début janvier 2027



A la suite des travaux du lot 1, les entreprises des lots 2 et 3 interviendront. Pour la partie basse, la « livraison » de l'aménagement de voirie est prévue au printemps 2027.

« Visuel » de l'aménagement de voirie (partie basse)

Mise en place d'un plateau à l'intersection avec la route départementale

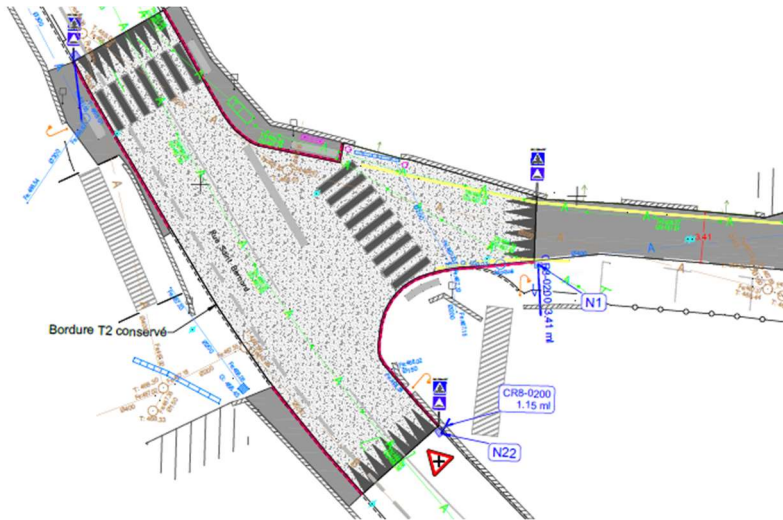

Rue du clos Don Jean : caniveau délimitant une bande « piétons » qui reste circulaire

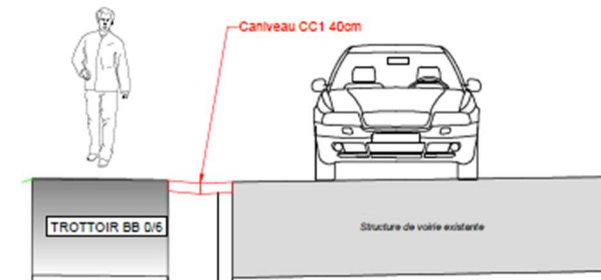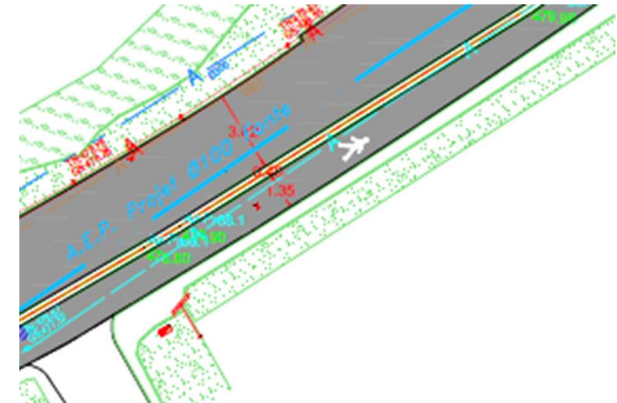


Menthon Saint Bernard- Route du Clos Don Jean
PHASAGE DE CIRCULATION (lot 1)

Les dates annoncées sont à titre indicatif et peuvent variées en fonction de l'avancée des travaux ou des complications rencontrées.

Phase 1


Du 21/09 au 02/10

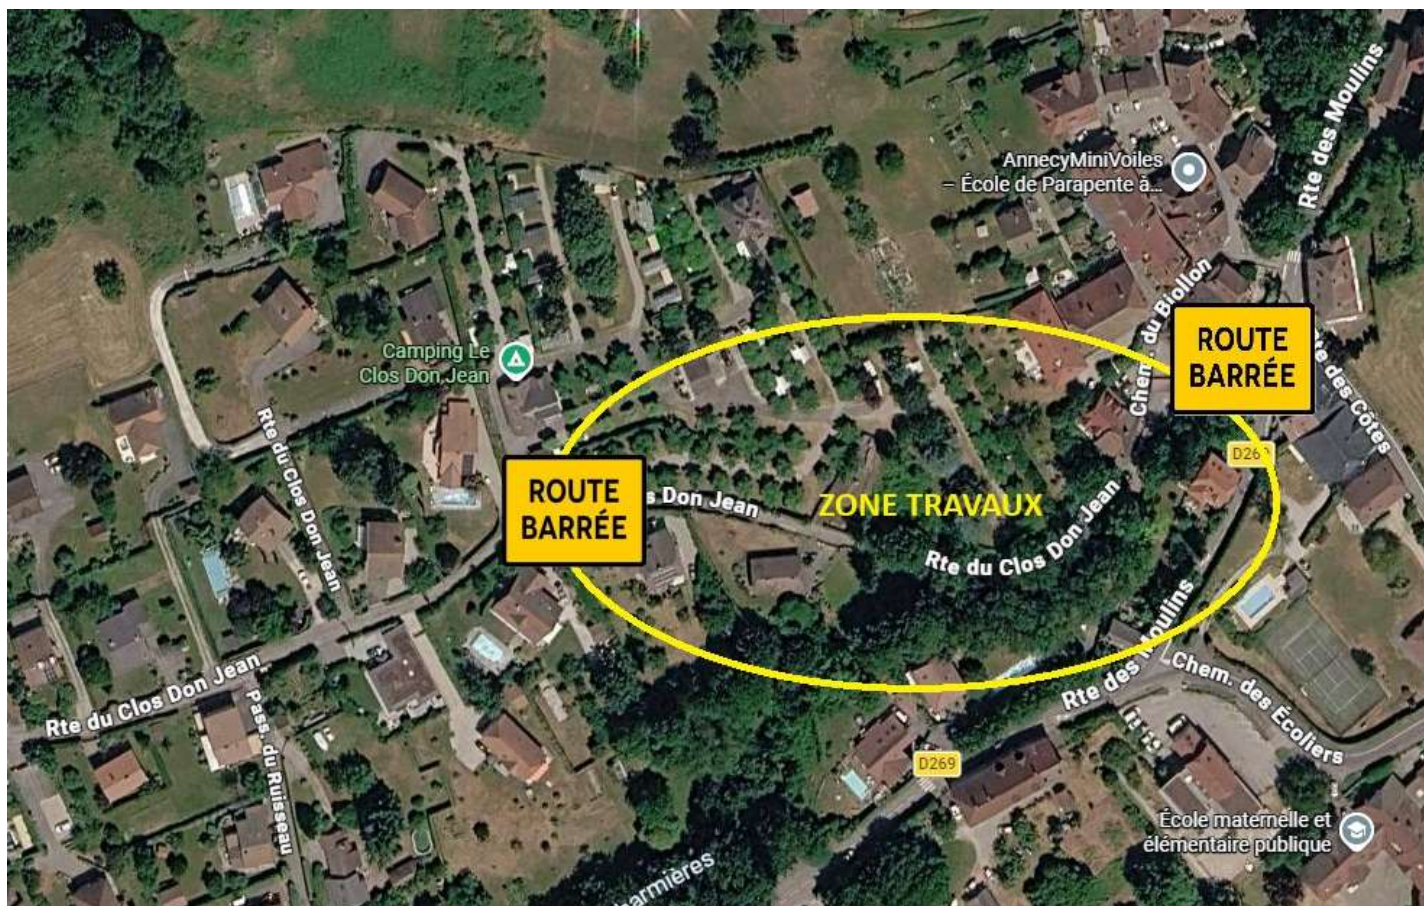

⇒ Accès des riverains par le bas de la Route du Clos Don Jean en double sens.

Phase 2

Du 05/10 au 27/11

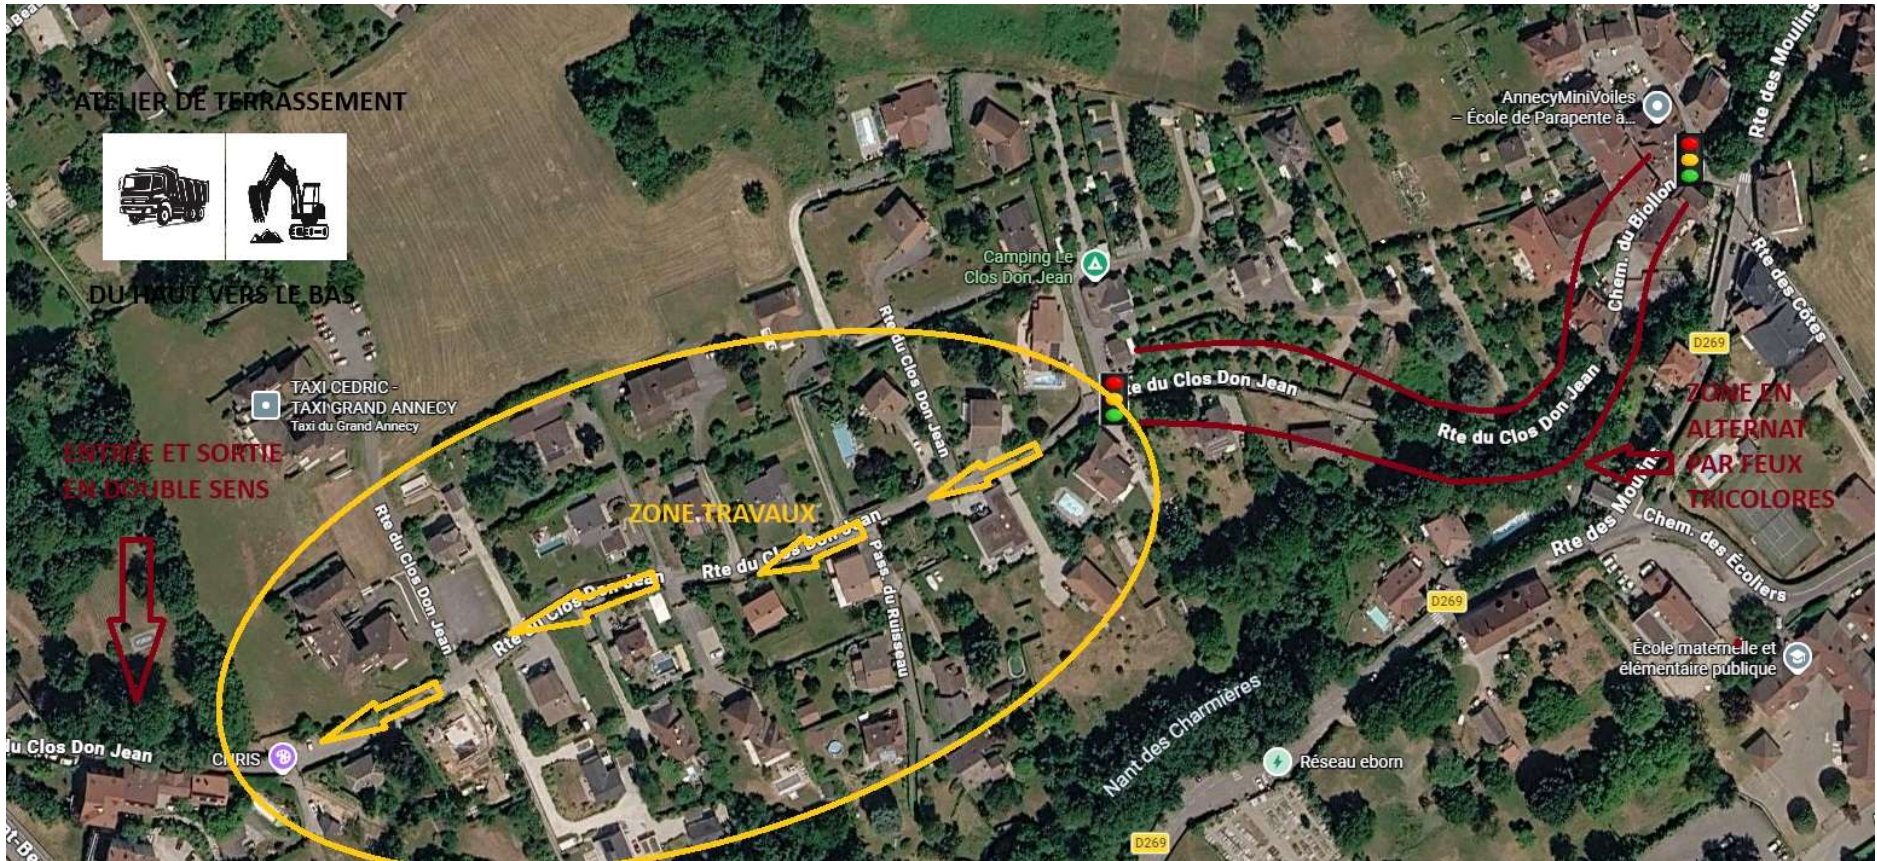

- ⇒ Sens de terrassement du camping vers la RD.
- ⇒ Entrée et sortie en bas par la RD en double sens.
- ⇒ Entrée et sortie en haut par le pont avec alternat par feux tricolores.

Phase 3


Du 30/11 au 17/12



- ⇒ Entrée et sortie par le haut de la Route du Clos Don Jean.
- ⇒ Parking conservé.

Phase 4

Du 04/01 au 27/02

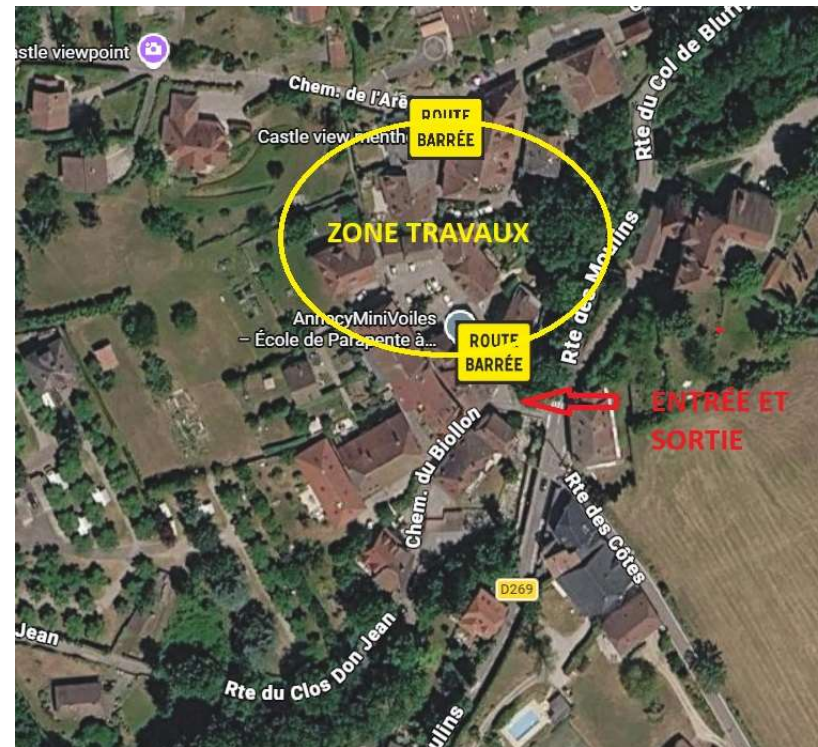

- ⇒ Entrée et sortie par le bas (Pont).
- ⇒ Parking conservé dans la mesure du possible mais pas en totalité.

A noter :

Du 31/08 au 18/09

Des travaux auront lieu dans les copropriétés du Clos Don Jean et le passage du ruisseau sans beaucoup d'impact sur la route principale.
